

大島町災害廃棄物 処理数量一覧

資料11

島内処理数量表 (平成27年2月末日現在)

種類	処理先	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1~3月	計
可燃性廃棄物 木くず等	野増清掃工場	49	30	128	73	197	0	0	0	0	0	87	113		677
コンから	オーレック			62	124	380	1,280	286	43	209	483	199	4	精算中	3,070
廃自動車・家電	京塚金属・オーレック			40	10	10	10	10	5	5	5			精算中	95
金属	京塚金属・オーレック	35	14	24	24	30	48	34	47	46	8			精算中	311
焼却灰・飛灰処理物	管理型処分場					32	4	54	1	0	5	8	179		283
ガラス・陶磁器等	安定型処分場							16	0	0	12	16	7	精算中	51
土砂	国交省 南部土捨場			3,588	10,410	5,527	9,198	11,557	13,548	12,966	8,449	0	0		75,245
	環境省 南部土捨場	868	0	0	0	0	0	0	371	814	74	5,046	561		7,734
自然回復事業 池, 割目火口跡	旧泉津, 南部し尿 池, 割目火口跡	1,490	0	0			1,198	4,823	2,899	1,230	2,850	2,970	2,416		19,875
	復旧工事 国民宿舎下、弘法浜	5,897	2,306	0					250						8,453
計		8,338	2,350	3,842	10,642	6,177	11,739	16,780	17,164	15,270	11,886	8,326	3,280		115,794
土砂	大島支庁 南部土捨場	11,613	7,050	15,330	22,431	16,861	11,624	11,716	7,059	27	0	1,903	0		105,615

※本表の合計値は、精算済の数値のみを集計したものである。

大島町災害廃棄物島外処理マスタ－工程表（平成26年12月）

（一部変更（受入処理計画量）／平成26年6月25日東京都策定）

平成27年12月26日
東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物処理課
公益財団法人東京都環境公社

○島外受入処理マスタ－工程表

災害廃棄物の種類等	受入処理量	平成26年												合計									
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月								
廃木材	計画		2,385.00			6,400.00										1,528.00			1,220.00				11,533.00
	実績		212.19	1,277.47		243.79	336.32	423.58	495.65	421.28	356.42	344.12							344.12				6,489.25
	月間進捗率		3.2%	22.7%		44.3%	59.0%	62.7%	67.8%	74.3%	81.8%	88.2%	93.7%	98.9%					98.9%				98.9%
（うち、流木系混合木材）	計画		2,240.00			6,400.00																	10,746.00
	実績		165.36	1,272.23		243.79	336.32	423.58	495.65	421.28	356.42	344.12							344.12				6,437.18
	月間進捗率		22.7%	57.7%		38.1%	52.1%	66.2%	72.8%	79.4%	85.4%	91.4%	97.4%	100.0%					97.4%				97.4%
（うち、解体系廃木材）	計画		75.00																				75.00
	実績		46.83																				46.83
	月間進捗率		61.1%																				61.1%
（うち、流木系直木材）	計画		70.00																				70.00
	実績		5.24																				5.24
	月間進捗率		7.5%																				7.5%
廃量・布団等	計画	29.00	14.00																				70.00
	実績	23.64	1.66																				46.76
	月間進捗率	39.4%	11.9%																				66.7%
建設混合廃棄物	計画	160.00	601.00			1,348.00																	2,728.00
	実績	120.13	186.08	285.13		64.47	338.91	56.74	40.89	54.33													1,362.62
	月間進捗率	8.6%	11.2%	17.7%		4.8%	25.1%	4.2%	3.0%	4.0%													49.9%
可燃性廃棄物（木くず等）	計画		1,020.00			2,240.00																	4,465.00
	実績		29.25	338.92	441.84	721.75	578.45	662.88	368.08	313.30	145.88	29.78											3,630.13
	月間進捗率		2.9%	33.2%	43.3%	32.2%	25.3%	16.4%	8.4%	2.6%	1.0%	0.3%											81.3%
廃タイヤ	計画																						10.00
	実績																						6.87
	月間進捗率																						68.7%
合計	計画	189.00	4,070.00			9,988.00																	18,806.00
	実績	143.77	29.25	746.89	2,006.10	2,256.03	1,638.54	971.14	1,046.57	796.90	691.46	505.39	358.83	344.76								11,535.63	
	累計進捗率	1.2%	1.4%	7.6%	24.3%	43.1%	56.7%	64.8%	73.5%	80.1%	85.8%	90.0%	93.0%	95.9%									95.9%

○島外船舶搬出マスタ－工程表

大島	元町港 (伊豆七島海運船)	波浮港 (新島物産船)	合計	平成26年												合計							
				12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月						
大島	計画	28	674			1,580																	3,159
	実績	25	13	147	244	367	253	182	194	124	119	104	45	52								1,869	
	月間進捗率	89.3%	1.9%	36.2%	23.2%	15.2%	11.4%	12.1%	9.7%	7.5%	6.5%	4.5%	10.0%								59.2%		
合計	計画	12	337			1,068																	1,992
	実績	12	2	75	235	262	195	93	121	98	71	36	67	33								1,300	
	月間進捗率	100%	0.6%	22.3%	70.0%	74.0%	62.7%	49.6%	50.0%	47.7%	41.7%	33.3%	20.0%	24.4%								65.3%	


可燃性廃棄物（木くず等）の清掃工場別搬入実績について

大島町災害廃棄物（可燃性廃棄物）清掃工場別搬入量一覧表

（単位：トン）

清掃工場名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
中央	29.25	106.85	61.51				146.56	13.27	73.15		430.59
港				384.66	100.11	294.46					779.23
墨田				112.58	170.76			166.62			449.96
新江東				224.51	226.76						451.27
有明		99.06	101.64				221.52	20.05			442.27
品川		32.72	150.31		80.82	368.42				29.78	662.05
江戸川		100.29	128.38					113.36	72.73		414.76
合計	29.25	338.92	441.84	721.75	578.45	662.88	368.08	313.30	145.88	29.78	3,630.13

月別搬入数量グラフ

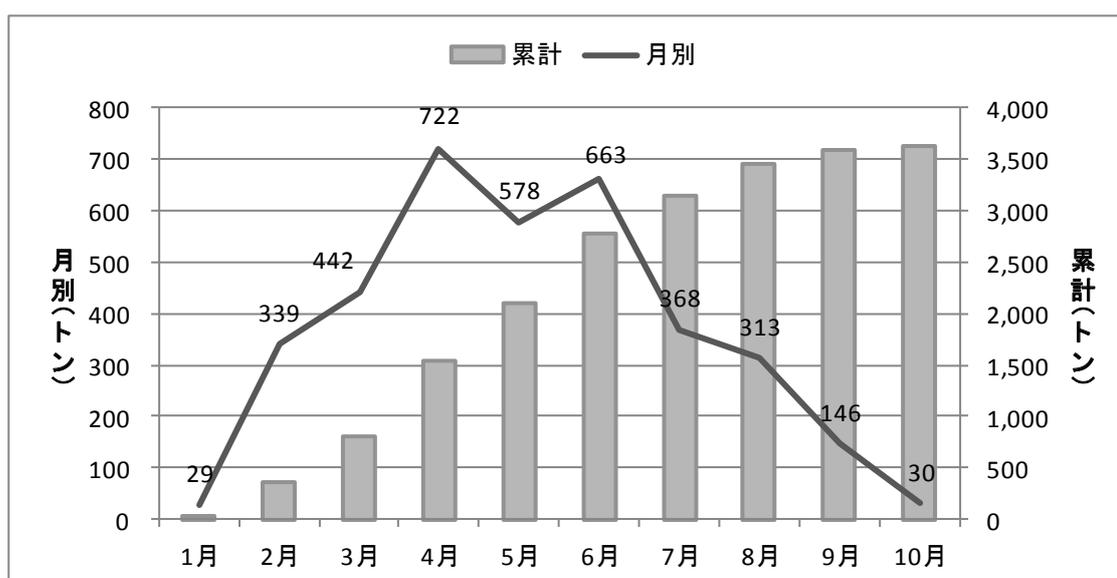

島外処理数量(民間処理分)

処理量(t)	有明興業				東京ボード工業				江東区 合計	リサイクル ・ピア		高俊興業	大田区 合計	総合計
	廃置	布団	廃タイヤ	建設系混 合廃棄物	解体系 廃木材	流木系 廃木材	流木系 直木材	流木系 直木材		建設系混 合廃棄物	建設系混 合廃棄物			
H25.12月(先行)	18.29								18.29	120.13	5.35		125.48	143.77
H26.1月								0.00	0.00				0.00	0.00
H26.2月	8.40	1.30			46.83	165.36		221.89	186.08				186.08	407.97
H26.3月		1.66				1,272.23	5.24	1,279.13	285.13				285.13	1,564.26
H26.4月						1,413.96		1,413.96	964.47				120.32	1,534.28
H26.5月						964.47		964.47	964.47				95.62	1,060.09
H26.6月						243.79		243.79	243.79				64.47	308.26
H26.7月	3.26					336.32		339.58	338.91				338.91	678.49
H26.8月	3.28					423.58		426.86	426.86				56.74	483.60
H26.9月	2.17		6.87			495.65		504.69	504.69				40.89	545.58
H26.10月						421.28		475.61	475.61				0.00	475.61
H26.11月						356.42		356.42	356.42				2.41	358.83
H26.12月						344.12		344.12	344.12				0.64	344.76
合計	35.40	2.96	6.87	54.33	46.83	6,437.18	5.24	6,588.81	1,027.88	3.05	5.35	280.41	1,316.69	7,905.50
業者別合計				99.56			6,489.25		1,030.93			285.76		

コンテナ基数	有明興業				東京ボード工業				江東区 合計	リサイクル		高俊興業	大田区 合計	総合計
	廃置	布団	廃タイヤ	建設系混 合廃棄物	解体系 廃木材	流木系 廃木材	流木系 直木材	流木系 直木材		建設系混 合廃棄物	建設系混 合廃棄物			
H25.12月(先行)	5							5	30	2			32	37
H26.1月								0					0	0
H26.2月	3	1			19	39		62	45				45	107
H26.3月		1				287	2	290	67				67	357
H26.4月						323		323					47	370
H26.5月						236		236					35	271
H26.6月						66		66					27	93
H26.7月	1					88		89	109				109	198
H26.8月	1					113		114	19				19	133
H26.9月	1		3			131		135	13				13	148
H26.10月				20		111		131					0	131
H26.11月						104		104		1			1	105
H26.12月						91		91		1			1	92
合計	11	2	3	20	19	1,589	2	1,646	283	2	2	109	396	2,042
業者別合計				36			1,610		285			111		
